






INY1 MOLDE 21B, TURNO DE MAÑANA, 8/11/21

Name	Measured value	Nominal value	+Tol	-Tol	Desviación	+/-
--CARA 200 ▶ --800						
 807SQ1 forme section 807 /ZYX	1,2213	0,0000	1,2000	0,0000	1,2213	 0,0213

807SQ1

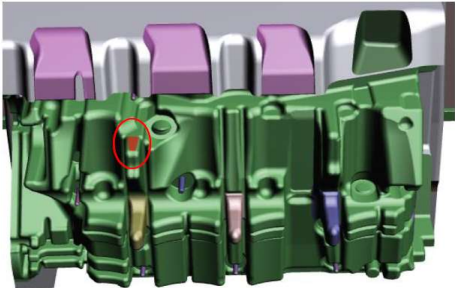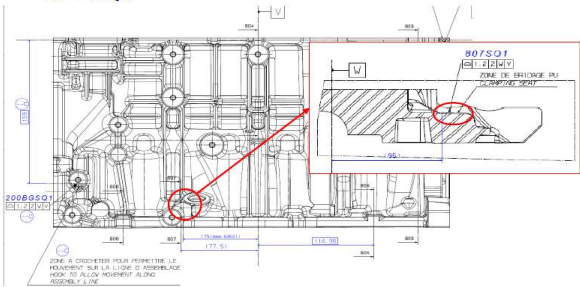

	Valor real	Valor nom.	Tol. inf.	Tol. sup.	Desviación
 807SQ1	1,908	0,000	1,200	0,708	1,908
X	106,222	106,197		0,025	0,025
Y	178,610	179,564		0,953	0,953
Z	77,911	77,917		0,006	0,006
forme section 807 /ZYX					

Exceso material pieza:
valor real (absoluto) menor que 179.564 (nominal)
Aportar material con Spark Depo
Ej: 178.610 (valor absoluto)

Faltas material pieza:
valor real (absoluto) mayor que 179.564 (nominal)
Quitar material con piedra fina
Ej: 180.015 (valor absoluto)
