


M21B INY1

02/11/22 TARDE

Name	Measured value	Nominal value	+Tol	-Tol	Desviación +/-
AV2L1 loc AV2 / Y (43,6)	1,2946	0,0000	1,2000	0,0000	1,2946   0,0946



NO SE PUEDE TOCAR

TOMOGRFÍA OK

	Valor real	Valor nom.	Tol. inf.	Tol. sup.	Desviación
 807SQ1	1.4651	0.0000	1.2000		0.2651
X	102.1048	102.0856			0.0192
Y	-178.7236	-179.4559			0.7323
Z	78.1728	78.1728			0.0000
forme section 807 /ZYX					

TOMOGRFÍA OK

807SQ1

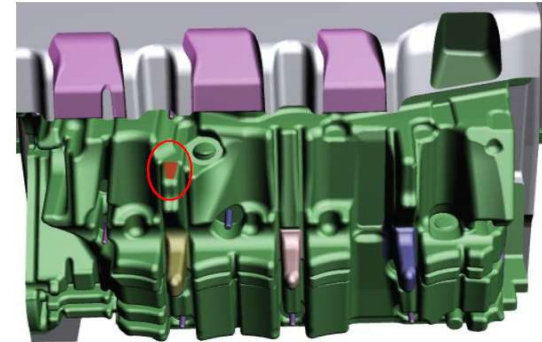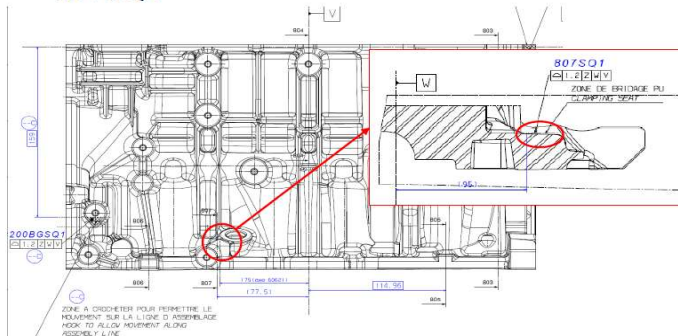

	Valor real	Valor nom.	Tol. inf.	Tol. sup.	Desviación
 807SQ1	1.908	0.000	1.200		0.708
X	106.222	106.197			0.025
Y	-178.610	-179.564			0.953
Z	77.977	77.977			0.000
forme section 807 /ZYX					

Exceso material pieza:**valor real (absoluto) menor que 179.564 (nominal)**

Aportar material con Spark Depo

Ej: 178.610 (valor absoluto)

Faltas material pieza:**valor real (absoluto) mayor que 179.564 (nominal)**

Quitar material con piedra fina

Ej: 180.015 (valor absoluto)
